



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003  
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009

**OFÍCIO Nº 030/SINFRA/2026**

**DE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra – MT.  
**PARA:** Câmara Municipal de Vereadores de Tangará da Serra-MT

**ASSUNTO: Obras de infraestrutura Jardim Acapulco**

Prezada Vereadora Zi Lima

Em atenção ao seu Requerimento n. 12/2026, Memorando 1doc n. Memorando 5.588/2026, vem, respeitosamente, informar que existem obras em execução no Bairro Jardim Acapulco, como segue:

a) Contrato n. 120/2024, objeto drenagem pluvial, em execução com conclusão correspondente a 82,50%, com previsão de término em 26/05/2026. Não teve ordem de paralisação.

b) Contrato n. 90/2024, objeto pavimentação asfáltica, com início de execução (tratamento da base) previsto para os próximos 15 dias, tendo sido dada a ordem de serviço em 10/04/2026, e prazo de execução 150 dias.

Cordialmente.

28 de abril de 2026, Tangará da Serra – MT

Assinado Digitalmente  
**MAGNO CESAR FERREIRA**  
Secretário Municipal de Infraestrutura





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1188-6EF5-5193-E911

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 28/04/2026 16:35:01 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1188-6EF5-5193-E911>

## 01 - DRENAGEM URBANA DO BAIRRO JARDIM ACAPULCO

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INTERVENÇÃO

Com a meta de ampliar a Infraestrutura e modernizar os serviços de drenagem e pavimento urbano, com execuções de obras no município, visando melhorar a infraestrutura e promover a sustentabilidade do sistema municipal.

O sistema proposto para o bairro Jardim Acapulco, é composto por drenagem urbana, boca de lobos e poços de visitas. Esta intervenção é 100% de recursos via BNDES.

### DADOS GERAIS DA INTERVENÇÃO

#### Dados Gerais da Intervenção

INTERVENÇÃO	
OBJETIVO	Drenagem Urbana do Bairro Jardim Acapulco
MUNICÍPIO	Tangará da Serra
DADOS CONTRATUAIS	
LICITAÇÃO	166/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.557/2024
CONTRATO	00120/ADM/2024
ORDEM DE SERVIÇO Nº	012/2025 de 28/05/2025
VALOR CONTRATUAL	R\$ 2.799.255,37
VALOR DE ADITIVO (ACRÉSCIMO)	R\$ 501.471,17
VALOR DE ADITIVO (SUPRESSÃO)	R\$ 74.302,02
VALOR DE REFERÊNCIA	SINAPI
ADITIVO DE PRAZO	-
PREVISÃO DE TÉRMINO	28/05/2026
EMPRESAS RESPONSÁVEIS	
EXECUÇÃO	O AZEVEDO MENDES – ME
FISCALIZAÇÃO	SINFRA DE TANGARÁ DA SERRA
STATUS	
STATUS DA INTERVENÇÃO	EM ANDAMENTO
% CONCLUÍDO	90,84%

Fonte: SINFRA

#### Valores Alocados na Intervenção – ID 20130403

Descrição	Valor (R\$)	% do total destinado à intervenção
Valor do Contrato	R\$ 2.799.255,37	-
Valor dos Aditivos (acrécimo)	R\$ 501.471,17	-
Valor dos Aditivos (supressão)	R\$ 74.302,02	-
Valor dos Reajustes	R\$ 173.700,78	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.400.125,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total pago até o momento</b>	<b>R\$3.088.842,18</b>	<b>90,84%</b>
<b>Saldo Contratual</b>	<b>R\$ 311.283,12</b>	<b>9,16%</b>

Fonte: SINFRA

### DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO

#### Pagamentos Efetuados no Período

Item Adquirido	Data do Doc	Valor Pago (R\$)			Data do Pagamento	Reajuste	
		Recurso Próprio	Sistema BNDES	Glosa		Valor Total (R\$)	Data do Pagamento
1ª Medição	13/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 390.090,50	0,00	-	-	
2ª Medição	08/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 333.471,93	0,00	R\$ 24.043,32	-	
3ª Medição	21/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 912.537,14	0,00	R\$ 65.793,92	-	
4ª Medição	30/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 381.471,98	0,00	R\$ 27.504,12	-	
5ª Medição	18/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 188.597,51	0,00	R\$ 13.597,88	-	
6ª Medição	17/02/2026	R\$ 0,00	R\$ 180.541,25	0,00	R\$ 13.017,02	-	
7ª Medição	01/04/2026	R\$ 0,00	R\$ 141.065,57	0,00	R\$ 10.170,82	-	
1º Medição Aditivo	20/01/2026	R\$90.467,36		0,00	R\$ 6.522,69		
2º Medição Aditivo	19/02/2026	R\$ 165.397,19		0,00	R\$ 11.925,13		
3º Medição Aditivo	06/04/2026	R\$ 123.707,54		0,00	R\$ 8.919,31		
Subtotal (RS)		<b>R\$ 379.572,09</b>	<b>R\$ 2.527.775.88</b>	0,00	<b>R\$ 181.494,21</b>	-	
Total (R\$)					<b>R\$ 3.088.842,18</b>		

Fonte: SINFRA


### DESEMPENHO FINANCEIRO

#### Valores Previstos dos Estudos e Projetos – ID 20130403

DESCRIÇÃO	Previsto	Executado	A Executar
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 268.761,19	R\$ 241.885,07	R\$ 26.876,12
2 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	R\$ 17.602,13	R\$ 17.136,13	R\$ 466,00
3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	R\$ 74.302,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 279.428,64	R\$ 260.122,74	R\$ 19.305,90
5 DRENAGEM PLUVIAL – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.963.012,84	R\$ 1.913.575,34	R\$ 49.437,50
6 OBRA DE ARTES CORRENTES	R\$ 196.148,55	R\$ 95.056,60	R\$ 101.091,95
7 ADITIVO	R\$ 501.471,17	R\$ 379.572,09	R\$ 121.899,08
8 SUPRESSIVO	R\$ 74.302,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.226.424,52</b>	<b>R\$ 2.907.347,97</b>	<b>R\$ 319.076,55</b>

Fonte: SINFRA

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

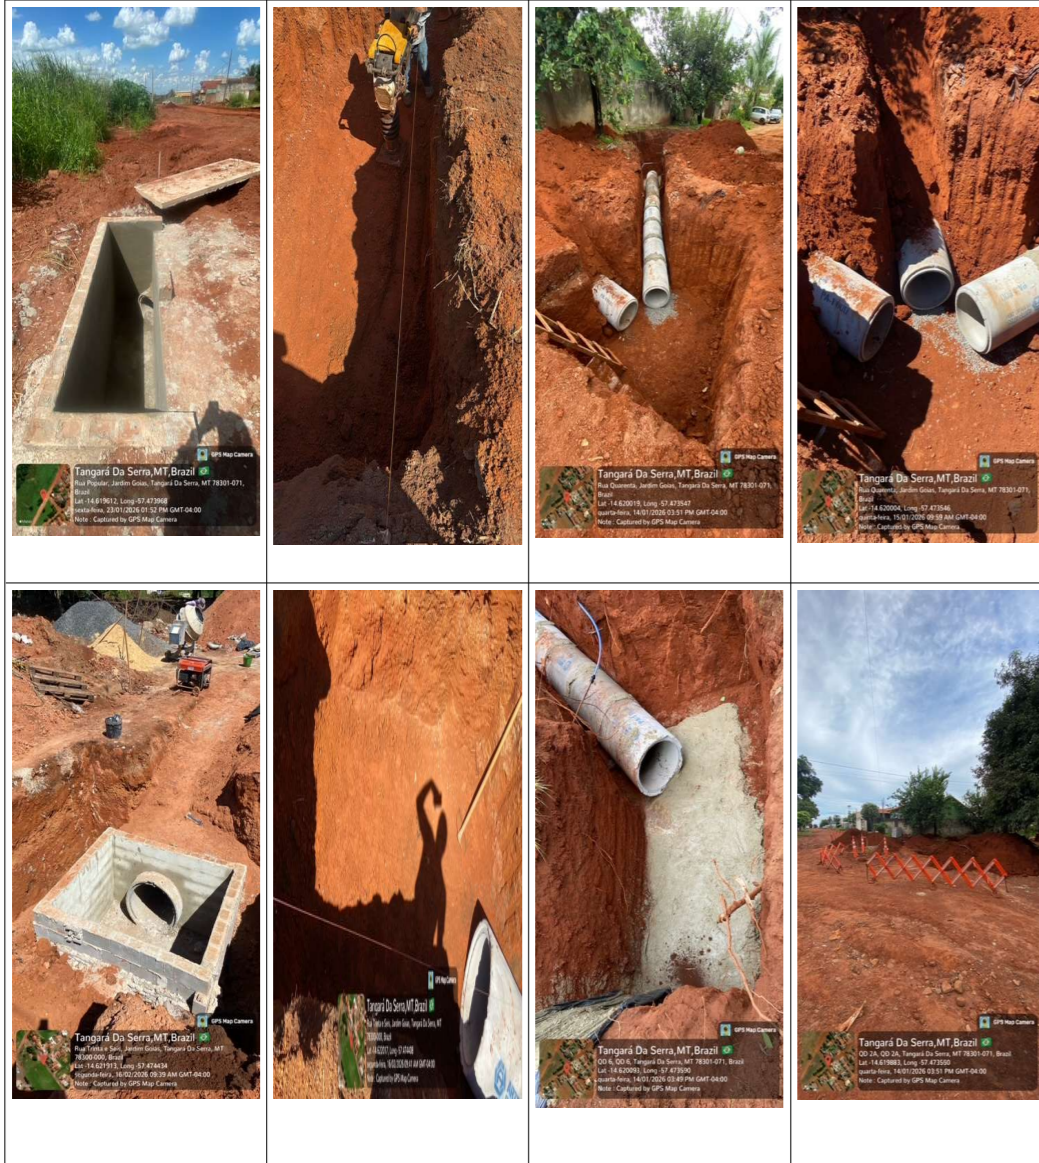

## 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO JARDIM ACAPULCO

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INTERVENÇÃO

Com a meta de ampliar a Infraestrutura e modernizar os serviços de drenagem e pavimento urbano, com execuções de obras no município, visando melhorar a infraestrutura e promover a sustentabilidade do sistema municipal.

O sistema proposto para o bairro Jardim Acapulco, é composto por pavimentação asfáltica urbana, meio-fio e sarjetas. Esta intervenção é 100% de recursos via BNDES.

### DADOS GERAIS DA INTERVENÇÃO

#### Dados Gerais da Intervenção

INTERVENÇÃO	
OBJETIVO	Pavimentação Asfáltica do Bairro Jardim Acapulco
MUNICÍPIO	Tangará da Serra
DADOS CONTRATUAIS	
LICITAÇÃO	095/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO	3.480/2024
CONTRATO	00090/ADM/2024
ORDEM DE SERVIÇO Nº	007/2026
VALOR CONTRATUAL	R\$ 4.198.773,70
VALOR DE ADITIVO (ACRÉSCIMO)	-
VALOR DE ADITIVO (SUPRESSÃO)	-
VALOR DE REFERÊNCIA	SINAPI
ADITIVO DE PRAZO	-
PREVISÃO DE TÉRMINO	17/09/2026
EMPRESAS RESPONSÁVEIS	
EXECUÇÃO	JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
FISCALIZAÇÃO	SINFRA DE TANGARÁ DA SERRA
STATUS	
STATUS DA INTERVENÇÃO	A INICIAR
% CONCLUÍDO	0,00%

Fonte: SINFRA

#### Valores Alocados na Intervenção – ID 20130403

Descrição	Valor (R\$)	% do total destinado à intervenção
Valor do Contrato	R\$ 4.198.773,70	100,00%
Valor dos Aditivos (acrécimo)	-	-
Valor dos Aditivos (supressão)	-	-
Valor dos Reajustes	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.198.773,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total pago até o momento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Saldo Contratual</b>	<b>R\$ 4.198.773,70</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SINFRA

\* Obra aguardando término de execução de drenagem e esgotamento sanitário.

### DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO

#### Pagamentos Efetuados no Período

Item Adquirido	Data do Doc	Valor Pago (R\$)			Data do Pagamento	Reajuste	
		Recurso Próprio	Sistema BNDES	Glosa		Valor Total (R\$)	Data do Pagamento
1ª Medição	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-	-	
2ª Medição	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-	-	
3ª Medição	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-	-	
4ª Medição	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-	-	
Subtotal (RS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-	-	
Total (R\$)		R\$ 0,00					

Fonte: SINFRA

### DESEMPENHO FINANCEIRO

#### Valores Previstos dos Estudos e Projetos – ID 20130403

	DESCRIÇÃO	Previsto	Executado	A Executar
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 212.777,16	R\$ 0,00	R\$ 212.777,16
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 41.522,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.804,84	R\$ 0,00	R\$ 6.804,84
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 103.028,40	R\$ 0,00	R\$ 103.028,40
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 102.978,04	R\$ 0,00	R\$ 102.978,04
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.485.859,12	R\$ 0,00	R\$ 2.485.859,12
7	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO	R\$ 882.080,94	R\$ 0,00	R\$ 882.080,94
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 363.722,72	R\$ 0,00	R\$ 363.722,72
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.198.773,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.198.773,70</b>

Fonte: SINFRA
